

건강-1	독산분소지역 주공13단지 데이케어센터 건립				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기후 (2023)
총사업비	2,860백만원	사업유형	계속/자체/건립	추진부서	어르신장애인과

정책목표

- 노인인구 비율이 높은 독산1동 분소 지역에 데이케어센터를 설치하여 노인성 질병을 가진 어르신을 위한 시간제 돌봄 서비스가 이루어짐으로써 노인의 생활안정 및 부양가족의 부담을 경감하고자 함

사업개요

- 위 치 : 한내로 69-75(독산동 1088-1외 5필지, 독산주공13단지 내)
- 규모 및 주요시설(안)

구 분	규모(m ²)	주요시설
합 계	991.74	-
1층	495.87 (약150평)	보건지소
2층	495.87 (약150평)	데이케어 센터
3~9층	-	수요맞춤형 공동홈
※ 수요 맞춤형 공동홈 : 30호 【영구임대 : 고령자 세어형 6호(24실), 행복주택 : 신혼부부 24호】		
변경 전		

⇒

구 분	규모(m ²)	주요시설	비 고
합 계	1,660	-	
1층	320 (약97평)	독산1동 주민센터 분소	복지시설
2~3층	670 (약203평)	보건지소	
4~5층	670 (약203평)	데이케어센터	
6~7층	-	수요맞춤형 공동홈	주거시설
※ 수요 맞춤형 공동홈 : 10호 【영구임대 : 고령자 세어형 6호, 행복주택 : 신혼부부 4호】			
변경 후			

- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2023. 6.
- 총사업비 : 2,860백만원(시비 300, 구비 2,560)

연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
독산분소지역 주공13단지 데이케어센터 건립	내공사와 협약 체결 및 데이케어센터 사업 신청 (구→서울시)	공사 설계 및 건립부지 변경으로 인한 토지교환 검토	서울시 투자심사 및 내공사와 사업 추진협의	실시설계 및 공사 발주	공사 착공 등 사업 추진

□ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,580	300	0	0	0	0	300	0	0	300	1,280	0
독산분소지역 주공 13단지 데이케어센터 건립	시 비	300	300	0	0	0	0	300 (이월)	0	0	300	0	0
	구 비	1,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,280	0

※ 2023년 : 1,280백만원(구비)

□ 추진실적

【18년 3분기】

- 2018.09. : 데이케어센터 사업신청(구→서울시)
- 2018.09. : 공사 설계(LH공사)

【18년 4분기】

- 2018.10.8. : 사회복지시설 병설 데이케어센터 설치 보조금 지원수령
(300백만원) ※2020년 반납
- 2018.10 : 주민설명회 개최

【19년 1분기】

- 2019.02. : 건립부지 변경 검토

【19년 3분기】

- 2019.07. : 독산1동 보건지소 건립사업 추진관련 검토의견 통보
- 2019.09. : 추가사업비 부담에 대한 LH검토결과 “불가” 회신

【19년 4분기】

- 2019.12. : 서울시 투자심사 계획 수립

【20년 1분기】

- 2020.03. : 서울시 투자심사 완료

【20년 3분기】


- 2020.10. : 사회복지시설 병설 데이케어센터 설치 보조금 지원수령
(300백만원 명시이월)

□ 향후계획

- 2021. 09. : 공사발주
- 2021. 12. : 공사 착공 등 사업 추진
- 2023. 06. : 공사 준공

작성자	어르신장애인과장 : 임미경 (1380) 팀장 : 김명훈 (1391) 담당 : 장은하 (1395)		
협업부서	보건의료과, 기획예산과	협조내용	보건지소 건립공사 추진 현황 공유 및 예산협조
중앙정부		서울시	어르신복지과

□ 위치도

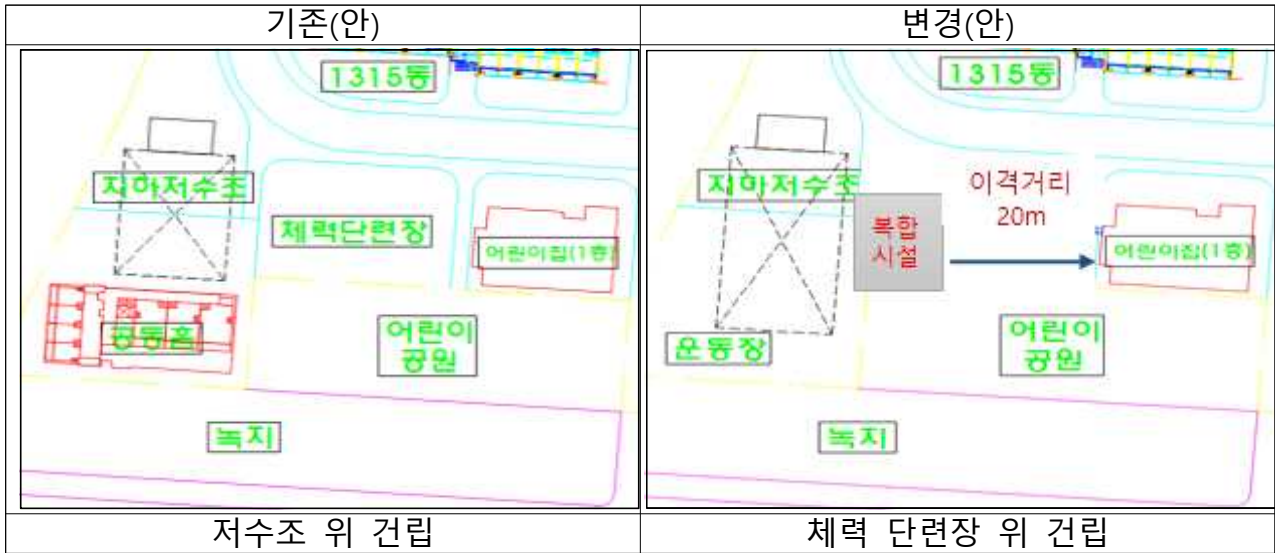

□ 현장사진

