

|        |                       |        |          |                |               |
|--------|-----------------------|--------|----------|----------------|---------------|
| 도시재생-4 | <b>서울둘레길 만남의광장 조성</b> |        |          |                |               |
| 추진상황   | 완료(종결)                | 이행률(%) | 100%     | 완료시기<br>(완료연도) | 임기내<br>(2019) |
| 총사업비   | 3,040백만원              | 사업유형   | 계속/자체/조성 | 추진부서           | 공원녹지과         |

### □ 정책목표

- 주택가 주변의 무질서한 경작지 정비를 통한 도시미관 개선
- 생활권 내 부족한 공원 및 쉼터를 확보하여 공원소외지역 해소
- 등산객들의 산행준비 장소마련 및 서울둘레길 초입 상권 등 지역경제 활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 시흥3동 산1-4호(안양시 경계지역)
- 면 적 : 46,922 $m^2$ (토지매입) / 광장조성 3,000 $m^2$
- 기 간 : '18. 2. ~ '19. 10.( '18년도 보상, '19년도 조성)
- 내 용 : 토지보상, 광장조성(휴게 및 편의 시설 설치, 수목식재 등)
- 소요예산 : 3,040백만원(국비 2,040, 특교 1,000)
  - 보상비 2,393(국·특교금), 조성비 610(국·바·사·비), 기타 37(감정평가비 및 설계비 / 특교금)

### □ 연차별 추진계획

| 구 분         | 2018년  | 2019년            | 2020년  | 2021년  | 2022년  |
|-------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 만남의<br>광장조성 | · 토지보상 | · 실시설계<br>· 광장조성 | · 유지관리 | · 유지관리 | · 유지관리 |

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

| 구 분                  | 재원별 | 합 계              |       | 연차별 투자수요 및 집행액 |       |       |     |       |     |       |     |          |     |
|----------------------|-----|------------------|-------|----------------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|----------|-----|
|                      |     |                  |       | 2018년          |       | 2019년 |     | 2020년 |     | 2021년 |     | 2022년    |     |
|                      |     | 확보액<br>및<br>투자수요 | 집행액   | 확보액            | 집행액   | 확보액   | 집행액 | 확보액   | 집행액 | 확보액   | 집행액 | 투자<br>수요 | 집행액 |
|                      | 계   | 3,040            | 3,040 | 2,500          | 2,430 | 540   | 610 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0        | 0   |
| 서울둘레길<br>만남의광장<br>조성 | 국 비 | 2,040            | 2,040 | 1,500          | 1,500 | 540   | 540 | -     | -   | -     | -   | -        | -   |
|                      | 시 비 | 1,000            | 1,000 | 1,000          | 930   | -     | 70  | -     | -   | -     | -   | -        | -   |

※ 시비(특교금) 1,000백만원 중 보상비로 930백만원 집행완료, 집행잔액 70백만원은 사고이월하여 용역비, 공사비로 집행완료

## □ 추진실적

### 【18년 1분기】

- '18. 2. 28. : 토지보상계획 열람공고

### 【18년 2분기】

- '18. 4. 3. : 區투자심사 → 적정

### 【18년 3분기】

- '18. 7. 17. : 토지감정평가 완료
- '18. 8. 22. : 공유재산심의 → 원안가결
- '18. 9. 12. : 공유재산관리계획(안) 심의 → 원안가결(구의회)

### 【18년 4분기】

- '19. 1. 17. : 우리구 상징성 구현방안 자문회의
- '19. 2. 20. : 주민설명회 개최

### 【19년 1분기】

- '19. 1. 17. : 우리구 상징성 구현방안 자문회의
- '19. 2. 20. : 주민설명회 개최

### 【19년 2분기】

- '19. 4. 12. : 실시설계 용역 완수
- '19. 5. 3. : 공사발주(580백만원) ※전기공사비 별도
- '19. 5. 27. : 공사착공 (공사기간 '19. 5. 27. ~ 9. 23.)
- '19. 6. 21. : 명칭공모 (공모기간 '19. 6. 12. ~ 6. 21.)

### 【19년 3분기】

- '19. 8. 1. : 명칭제정 추가자문
- '19. 8. 19. : 명칭제정 선호도 조사 시행
- '19. 8. 30. : 구 지명위원회 개최(호암산숲길공원 선정)

### 【19년 4분기】


- '19. 10. 8. : 공사준공
- '19. 10. 16. : 공사 준공행사

|       |  |       |               |
|-------|--|-------|---------------|
| 작 성 자 | 공원녹지과장 : 배남현(1650)    팀장 : 강종희 (1661)    담당 : 송대승 (1663) |       |               |
| 협업부서  |  | 협업내용  |               |
| 중앙정부  | 국토교통부 녹색도시과  | 서 울 시 | 푸른도시국 공원녹지정책과 |

□ 위치도



만남의 광장 조성대상지(시흥동 산 1-4 번지 안양시 경계지역)

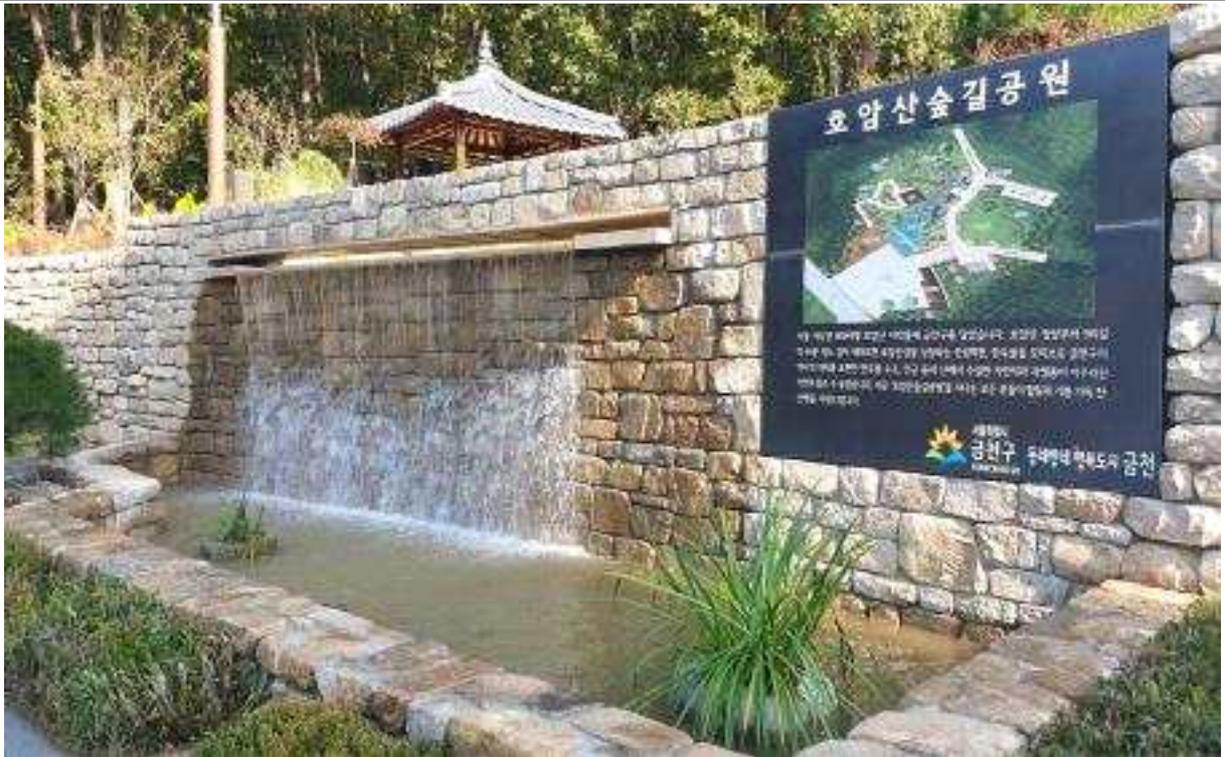

준공 사진
