

문화-8	<b>시흥행궁 복원 및 정조대왕 행사 지원 강화</b>				
추진상황	완료(계속)	이행률(%)	100%	완료시기 (완료연도)	임기내 (2022)
총사업비	1,247백만원	사업유형	계속/자체/기타	추진부서	문화체육과

## □ 정책목표

- 시흥행궁 복원 및 활용을 통한 지역의 정체성 확립과 정조대왕 능행차 재현 행사 지원강화를 통해 시흥행궁의 역사적 의미를 재조명하고,
- 시흥행궁에서 있었던 역사적 사실을 축제와 결합하여 역사와 문화가 어우러진 전통행사로 다양한 볼거리를 제공

## □ 사업개요

- 정조대왕 능행차 공동재현 행사
  - 위 치 : 시흥대로(시흥IC~시흥행궁터) 및 마을공동체지원센터 앞
  - 기 간 : 매년 10월 경
  - 내 용 : 의궤복원(행렬, 격쟁), 전통공연, 국악경연대회, 온라인 행사 등
  - 총사업비 : 334백만원(시비 79, 구비 255)
- 시흥행궁 전시관 조성
  - 위 치 : 시흥동 910-1 외 3필지, 시흥5동 주민센터(복합청사) 6층
  - 기 간 : 2020. 1.~2022. 2.
  - 주요시설 : 시흥행궁 전시실, 디지털 실감영상관, 전망데크, 아카이브
  - 총사업비 : 913백만원(구비)

## □ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
지역문화 브랜드화	제2회 정조대왕 능행차 행사	제3회 정조대왕 능행차 행사	제4회 정조대왕 능행차 행사, 시흥행궁 전시관 설계	시흥행궁 전시관 전시물 제작 설치 용역 및 공사	시흥행궁 전시관 운영, 정조대왕 능행차 행사

## □ 연차별 투자수요 및 집행액

(단위 : 백만원)

구 분	재원별	합 계		연차별 투자수요 및 집행액									
				2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
		확보액 및 투자수요	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	확보액	집행액	투자 수요	집행액
	계	1,247	710	94	92	107	103	103	85	754	683	189	0
시흥행궁 전시관 조성	구 비	913	515	-	-	-	-	86	85	696	683	131	-
정조대왕 능행차	시 비	79	75	34	34	45	41	0	0	0	0	-	-
	구 비	255	120	60	58	62	62	17	0	58	0	58	-

## □ 추진실적

### [2017년]

- 2017. 2.16. : 시흥행궁 학술조사 기본계획 수립
- 2017. 3.~12. : 시흥행궁 복원을 위한 학술조사 용역실시
  - 수행업체 : (재)한강문화재연구원, 소요예산 : 69,949천원(구비)
  - 주민공청회 및 문화재 조사발굴 전문가 자문회의 : 3회
- 2017.9. 7. : 시흥5동 주민센터 내 시흥행궁 전시관 설치계획
- 2017.9.23.~9.24. : 제2회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 실시

## **【2018년】**

- 2018.10. 6.~10. 7. : 제3회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 실시
- 2018.11.~12. : 시흥5동 복합청사 건립 자문단회의 및 주민설명회

## **【2019년】**

- 2019. 1. 31. : 시흥5동 복합청사 건립 자문단 회의 결과
  - 시흥5동 복합청사 당초안(6층 행궁전시실, 체험실)으로 유지
- 2019. 6. : 정조대왕 능행차 축제거버넌스 위원 공개모집
- 2019. 7.~8. : 축제거버넌스 구성·운영(3차 정기회의 진행)
- 2019. 9. : 출연진, 체험프로그램 등 용역 및 물품 계약, 안전관리 심의 및 직원 안전요원 모집·배치, 행사 홍보 등
- 2019. 10. : 제4회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 개최 및 평가
- 2019. 11. : 정산보고서 제출(서울시)

## **【2020년】**

- 2020. 1. : 우수 전시관 벤치마킹(수원화성박물관 외 9개소)
- 2020. 2. : 정조맞이 금천 국악경연대회 보조사업자 공모계획 수립
- 2020. 4. : 시흥행궁 전시관 조성관련 자문위원회 구성
- 2020. 5. : 시흥행궁 전시관 조성관련 자문위원회 회의(2회)
- 2020. 7. : 시흥행궁 전시관 조성계획 수립, 코로나19관련 정조행사비 감추경
- 2020. 8. : 시흥행궁 전시관 용역 업체선정을 위한 입찰공고
- 2020. 9. : 제안서평가위원회 개최 등 업체 선정 및 용역 사전보고회
- 2020. 10. : 시흥행궁 전시관 전시설계 용역계약 및 착수
- 2020. 12. : 전시설계관련 전문가 자문 및 용역 중간보고회

## **【21년 1분기】**

- 2021. 1. : 시흥행궁 전시관 전시설계 주민설명회, 설계용역 준공
- 2021. 3. : 시흥행궁 전시관 전시물 제작·설치용역 계약 및 착수

### 【21년 2분기】

- 2021. 4. : 시흥행궁 전시관 전시물 제작·설치 용역 착수보고회
- 2021. 5. : 시흥5동 주민센터 신축관련 설계변경 요청(전시관, 도서관)
- 2021. 6. : 정조맞이 국악경연대회 실무회의

### 【21년 3분기】

- 2021. 8.~9. : 정조맞이 국악경연대회 홍보 및 참가자 모집
- 2021. 9. : 제1회 금천 정조대왕 맞이 전국 청소년 국악경연대회 개최  
제5회 정조대왕 능행차 공동재현 행사 전면 취소

### 【21년 4분기】

- 2021. 10. : 국악경연대회 수상자의 '제26회 금천구민의 날' 식전공연
- 2021. 11. : 전시관 시설·전기 공사계획 및 계약 체결, 사고이월계획 수립
- 2021. 12. : 전시관 홍보물 제작 및 운영물품 구매, 공사 착공

### □ 향후계획

- 2022. 2. : 전시관 시설 및 전기공사 준공
- 2022. 3. : 전시관 개관 및 운영

작성자	문화체육과장 : 유민석(1440) 팀장 : 신진희(1451) 담당 : 정혜미(1452)		
협업부서	마을자치과, 건축과, 시흥5동 주민터 등	협업내용	시흥행궁 전시관 조성, 정조대왕 능행차 재현행사 추진
중앙정부	문화재청(보존정책과)	서울시	역사문화재과

□ 위치도



시흥행궁 추정지(시흥5동 830번지 일원)



시흥행궁 복원예상도

□ 정조대왕 능행차 재현행사 사진



2016년



2017년



2018년



2019년




2021년 금전 정조대왕 맞이 국악경연대회



제25회 구민익날 식전공연

□ 시흥행궁 전시관 평면도 및 조성예상도

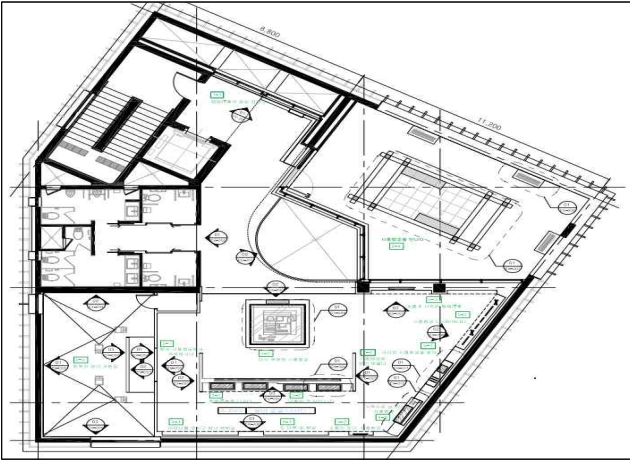

설계도면



조성 예상도
